




H. Ayuntamiento Constitucional de Teoloyucan Administración Municipal 2022-2024

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"



Gobierno de
Teoloyucan
Trabajando Unidos
2022-2024

Teoloyucan, Estado de México a 11 de Julio de 2023

No. De Oficio: **DIR-OP/RGM/0368-2023**

Asunto: **REPORTE DE SISTEMA DE AVANCE
MENSUAL DEL RAMO 33 (SIAMAMEN)
AL MES DE JUNIO DEL 2023**

LIC. YAZMÍN ENRÍQUEZ VÁZQUEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD

P R E S E N T E:

Por este conducto reciba un cordial saludo, y de la manera más respetuosa, con fundamento en el **Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios**, le remito en forma impresa, el informe de avance mensual correspondiente al mes de **JUNIO del año 2023**; del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FAISMUN 2023**) correspondientes al **ejercicio fiscal 2023**.

Así también se incluye el informe correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FORTAMUN 2023**), correspondientes al mes de **JUNIO del ejercicio fiscal 2023**.

Dichos reportes se envían, para dar así cumplimiento a lo establecido en LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN), vigentes.


Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**


ING. RAMÓN GONZÁLEZ MUÑOZ



Ccp. Archivo RGM/HSC / PRESIDENCIA / TESORERÍA / CONTRALORÍA



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,063,969.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MATAMOROS DE CALLE ALLENDE A CALLE ESTRELLA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ACOLCO / TEOLOYUCAN	CONTRATO	2023-06-01	2023-07-31	2,452,629.37	2,452,629.37	0.00	1,225,626.36	1,225,626.36	0.00	02 METRO CUADRADO	1,685.00		2 COLONIA	1	2,595	50	49.97	
17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA MORELOS DE CALLE MORELOS A LA CERRADA SIN NOMBRE DEL KILOMETRO CERO MÁS CERO AL KILOMETRO CERO MAS QUINIENTOS DIEZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SAN JUAN. / BARRIO SAN JUAN	CONTRATO	2023-06-01	2023-07-31	2,300,331.27	2,300,331.27	0.00	1,149,641.25	1,149,641.25	0.00	02 METRO CUADRADO	2,255.00		2 COLONIA	1	3,365	50	49.98	
17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA CERRADA SIN NOMBRE A LA AVENIDA HIDALGO Y DE LA CERRADA INDEPENDENCIA A LA CERRADA VICTORIA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTO TOMAS. / BARRIO SANTO TOMAS	CONTRATO	2023-06-01	2023-07-31	2,123,704.86	2,123,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3,173.00		2 COLONIA	1	4,035	0	0.00	
17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA SANTIAGO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL KILOMETRO CERO MÁS CERO AL KILOMETRO CERO MAS SEISCIENTOS VEINTICUATRO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO. / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2023-06-01	2023-07-31	2,105,504.74	2,105,504.74	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,860.00		2 COLONIA	1	3,157	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 4								TOTAL	8,982,170.24	8,982,170.24	0.00	2,375,267.61	2,375,267.61	0.00								100



Complementarios: 4 Directa: 0



PRESIDENCIA



CONTROLADORA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
 TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
 TEL: (01722) 6250482
 TEL: (01722) 6250469



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
 Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,063,969.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción			Fec. Ini. Pro.			Fec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.



PRESIDENTE

MAESTRO EN
 ADMINISTRACIÓN
 PÚBLICA JUAN CARLOS
 URIBE PADILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL



ING. CHRISTIAN VARGAS
 QUIJANO
 TESORERO MUNICIPAL



ING. RAMÓN GONZÁLEZ
 MUÑOZ
 DIRECTOR DE OBRAS
 PÚBLICAS



CONTRALORÍA
 MUNICIPAL

LIC. ANGEL DOMINGUEZ
 MERCADO
 CONTRALOR MUNICIPAL

TEOLOYUCAN



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023


Reporte de Ejercicio Acumulado

ANCIERO ASIGNADO: \$ 58,350,516.71 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
03	ASH	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION	064 POZO DE AGUA POTABLE	SEGUNDA ETAPA DE LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL. EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE / SANTA CRUZ DEL MONTE	CONTRATO	2023-07-03	2023-09-29	3,520,414.93	3,520,414.93	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	12.00		2 COLONIA	1	4,480	0	0.00
03	ASH	URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA OBSERVATORIO DE LA CALLE 13 DE JUNIO A LA CALLE TRUENO DEL KM 0+000 AL KM 0+360 EN PARAJE SAN JOSE. / BARRIO SAN JOSE	CONTRATO	2023-07-03	2023-09-29	3,313,084.80	3,313,084.80	0.00	993,342.08	993,342.08	0.00	02 METRO CUADRADO	2,100.00		2 COLONIA	1	1,210	30	29.98
03	ASH	URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TLALPAN DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN Bo. ZIMAPAN / BARRIO ZIMAPAN	CONTRATO	2023-07-03	2023-09-29	2,357,819.36	2,357,819.36	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,696.60		2 COLONIA	1	3,295	0	0.00
03	ASH	URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAMON GUZMAN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A LA CALLE RAMON GUZMAN DEL KM 0+000 AL KM 0+293 EN Bo. SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO. / SAN BARTOLO	CONTRATO	2023-07-03	2023-09-29	2,508,792.61	2,508,792.61	0.00	752,133.09	752,133.09	0.00	02 METRO CUADRADO	1,932.00		2 COLONIA	1	3,663	30	29.98
09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-23	2023-12-31	23,951,647.22	23,951,647.22	0.00	7,524,330.51	7,524,330.51	0.00	80 ELEMENTO	131.00	131.00	4 MUNICIPIO	1	66,518	31	31.42
09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-23	2023-12-31	3,836,858.76	3,836,858.76	0.00	1,347,971.31	1,347,971.31	0.00	80 ELEMENTO	24.00	24.00	4 MUNICIPIO	1	66,518	35	35.14
09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-23	2023-12-31	3,473,123.14	3,473,123.14	0.00	2,064,682.80	2,064,682.80	0.00	34 VEHICULO	82.00	82.00	4 MUNICIPIO	1	66,518	59	59.45
08	ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIO ANTERIOR POR OBRA Y SERVICIOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-23	2023-12-31	2,266,576.88	2,266,576.88	0.00	1,733,374.99	1,733,374.99	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	77	76.47
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCIDO: 8								TOTAL	45,228,317.70	45,228,317.70	0.00	14,415,834.78	14,415,834.78	0.00								262

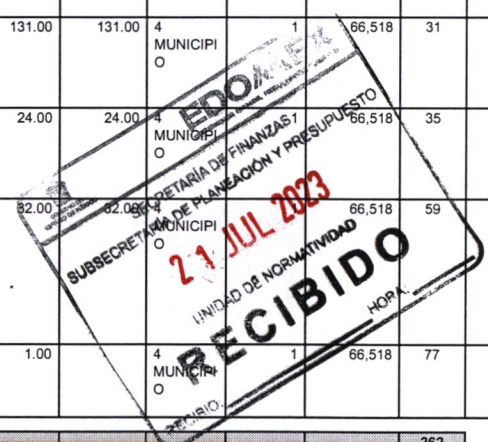

Complementarios: 0 Directa: 0



REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 58,350,516.71 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.



PRESIDENCIA
MAESTRO EN
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA JUAN CARLOS
URIBE PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



ING. CHRISTIAN VARGAS
QUIJANO
TESORERO MUNICIPAL



ING. RAMÓN GONZÁLEZ
MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS



LIC. ANGEL DOMINGUEZ
MERCADO
CONTRALOR MUNICIPAL

TEOLOYUCAN

